شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

أمانة جدة

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☑	مشروع تلال الغروب	
اعادة تقديم ☐	استمارة طلب تسليم رقم 26	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط :BLOCK10   رقم الشارع : PED-D10-24   عرض الشارع: 9.40

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE2   من محطة رقم :0+00   الى محطة رقم :0+46.05

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع :   التاريخ :   /   /

☐ المراقب   ☐ المساح   ☐ المختبر   توقيع المهندس المشرف ....

مرئيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخرى
☑ متطابق
☐ غير متطابق

ملاحظات : ....   التوقيع: التاريخ :   /   /

من محطة :   الى محطة :

توقيع المساح :   التاريخ :   /   /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلي :
☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ :   /   /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☑ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ :   /   /








الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقــرير إســـتلام طـبقــة ردم

PED-B10-24	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-		
46.05M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-		
9.4	عرض الشارع :-	BOUTTOM OF SUPGRADE-2	رقم الطبقة :-		
WIDHT-R	4.700	LAYAER THICKNESS	0.150		
WIDHT-L	4.700	DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000		

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L			CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%			
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000			
1	0	529109.934	2369678.196	53.100	53.140	53.140	53.140	53.100	4.700	4.700	0.032
2	12.5	529114.735	2369689.737	53.124	53.164	53.164	53.164	53.124	4.700	4.700	0.188
3	25	529119.537	2369701.278	53.149	53.189	53.189	53.189	53.149	4.700	4.700	0.277
4	37.5	529124.338	2369712.819	53.173	53.213	53.213	53.213	53.173	4.700	4.700	0.289
5	46.05	529127.623	2369720.713	53.190	53.230	53.230	53.230	53.190	4.700	4.700	0.331

الإستشاري	**المقاول**
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	**شركة طرق الرياض للمقاولات**
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-

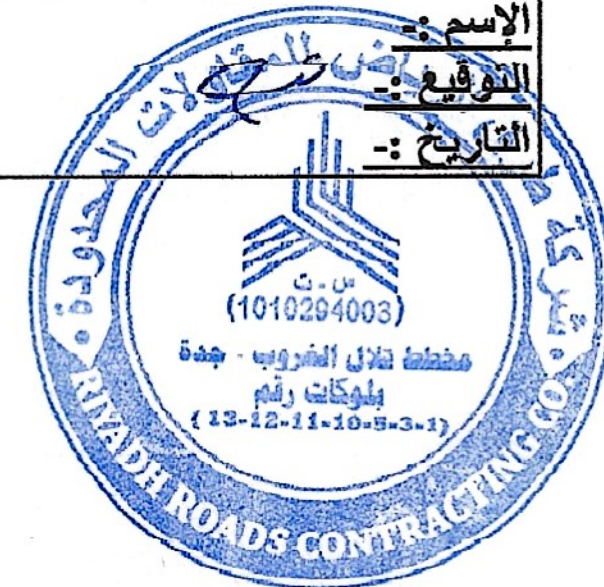

BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM

FINISHING 10-20 CM

FINISHING 20-30 CM

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

PED. B10-2

PED. B10-3

PED. B10-7

PED. B10-8

PED. B10-10

PED. B10-12

PED. B10-22

PED. B10-23

PED. B10-25

PED. B10-27

N:2370000

N:2369900

N:2369850

N:2369800

N:2369750

N:2369700

N:2369650

N:2369600

E:529050

E:529100

E:529150

E:529200

E:529250

E:529300

E:529350

E:529000

E:528950

E:528900



اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمى

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية

امانة مدينة جدة

الادارة العامة للطرق والانفاق

ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب

بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	
NO. 3	GENERAL LAYOUT PLAN
مقياس الرسم:	1:1500

مدير ادارة تصميم الطرق

مدير عام الدراسات والتصاميم

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.
